

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 001
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	SUPERVISION CAPAMI		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOCOLACION DE LA OBRA.		FECHA: 15 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION

LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA HACE LA VISITA DE APERTURA DE SUPERVISION EN LA COLONIA RENACIMINETO EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, COMO SUPERVISOR SE DESIGNA AL ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE LA CAPAMI, COMO RESIDENTE DE LA OBRA EL ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO; DANDO FE DE QUE EL CONTRATO CAPAMI -OP-01-2021 SE INICIA EN TIEMPO Y FORMA Y QUE LA EJECUCION SE REALIZARA CONFORME A33AL CATALOG DE CONCEPTOS DESCRITO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO CONSTRUCCION DE LINA DE DISTRIBUCION HIDRAULICA PARA LA COL. RENACIMIENTO CON UN MONTO NETO DE \$ 873,968.01 PESOS M.N. SIN MAS SE DA POR TERMINADO LA VISITA DE APERTURA DE SUPERVISION.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021


ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021


C.P. BULMARO MUNDO REYNA
 CONTRALOR INTERNO DE CAPAMI.
CONTRALORIA INTERNA


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021


LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ.
 DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI.



DIRECCION GENERAL

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 003
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 1		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLOACION DE LA OBRA.		FECHA: 15 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION

INICIO DE SUPERVISION POR PARTIDAS:
1.- TUBERIAS Y CRUCEROS
- EN LA VISITA DE SUPERVISION SE RESTIFICO EL USO DE CINTA METRICA Y PLOMOS PARA TRZAR LA DIRECCION DE LA TUBERIA CONFORME AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ASI MISMO, SE VERIFICO EL TRASPASO DE NIVELES SEGUN PROYECTO.
- SE HIZO LA MEDICION EN CEPAS DE HASTA 1 M DE ANCHO Y 2.00 M DE PRFUNDIDAD COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

UBICACION DE LOS OCNCEPTOS:
MANZANAS 3,4,5 SEGUN PROYECTO.

OBSERVACIONES:
- NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE ALTERACION CONFORME AL PROYECTO SE QUEDA DE CIERTO QUE LA OBRA PUEDE OCNTINUAR OCN SU EJECUCION.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2018-2021

 ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.	 C.P. BULMARO MUNDO REYNA. CONTRALORIA INTERNA
--	--


LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 004
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 2		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLACION DE LA OBRA.		FECHA: 19 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION


SUPERVISION POR PARTIDAS:
EN LA VISITA SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CONLUIDOS EN LAS MANZANAS 3 Y 4 AL 70 % EN LAMANZANA 5. TAMBIEN SE OBSERVA QUE LA CUADRILLA ESTA TOMANDO LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO A L PIE DE LA LETRA YA QUE, EL AFINE SE ESTA REALIZANDO CON IRIIGACION DE AGUA Y COMPACTADO CON PIZON DE MANO AUQNUE NO LO ESTIPULE EL PROYECTO. OTRO DETALLE SUPERVISADO FUE LA FICHA TECNICA DE LA TUBERIA DE PVC CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES AL SER UN TUBO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 2" SISTEMA INGLES.

UBICACION DE LOS OCNCEPTOS:
MANZANAS 3,4,5 SEGUN PROYECTO.

OBSERVACIONES:
- NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE ALTERACION CONFORME AL PROYECTO SE QUEDA DE CIERTO QUE LA OBRA PUEDE OCNTINUAR OCN SU EJECUCION.



<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p>ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p>ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS</p> <p>CP. BULMARO MUNDO REYNA CONTRALOR INTERNO DE CAPAMI</p> <p>CONTRALORÍA INTERNA</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p>CP. BULMARO MUNDO REYNA CONTRALOR INTERNO DE CAPAMI</p> <p>LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI.</p> <p>DIRECCION GENERAL</p>
---	--	--

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 004
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 3		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLACION DE LA OBRA.		FECHA: 23 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION	REPORTE FOTOGRAFICO
-------------	---------------------


SUPERVISION POR PARTIDAS:
SE OBSERVA LA COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA RECIBIR LA TUBERIA CON UN ESPESOR DE 20 CM Y ACOSTILLADO DE LA TUBERIA EN UN 75 % A LOS LATERALES, TAMBIEN SE OBSERVA QUE EN LA CEPAS REALIZADAS EN LAS MANZANAS DONDE YA CONCLUYO LA EXCAVACION SE ESTA INSERTANDO TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 2" Y AL MISMO TIEMPO SE ESTA PROCEDIENDO A RELLENAS LAS CEPAS CON RELLENO PRODUYCTO DE LA EXCAVACION DESPUES DE HABER ACOJINADO Y ACOSTILLADO LA TUBERIA. SE VERIFICO LA INSTALACION DE LA TUBERIA SISTEMA INGLES CON ESPIGA CAMPANA ACOPLADO CON GRASA PARA TUBERIA. POR ULTIMO SE VERIFICO COMPACTACION CON PIZON DE MANO Y BANDEO DE CEPAS CON LLANTA DE LA RETROEXCAVADORA.

UBICACION DE LOS OCNCEPTOS:
MANZANAS 3,4,5 SEGUN PROYECTO.

OBSERVACIONES:
- NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE ALTERACION CONFORME AL PROYECTO SE QUEDA DE CIERTO QUE LA OBRA PUEDE OCNTINUAR OCN SU EJECUCION.



<p>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p>ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.</p>	<p>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p>C.P. BULMARO MUNDO DE IGUALA CENTRALOR INTERNO DE CAPAMI</p> <p>CONTRALORÍA INTERNA</p>	<p>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p>LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI.</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>
---	--	---

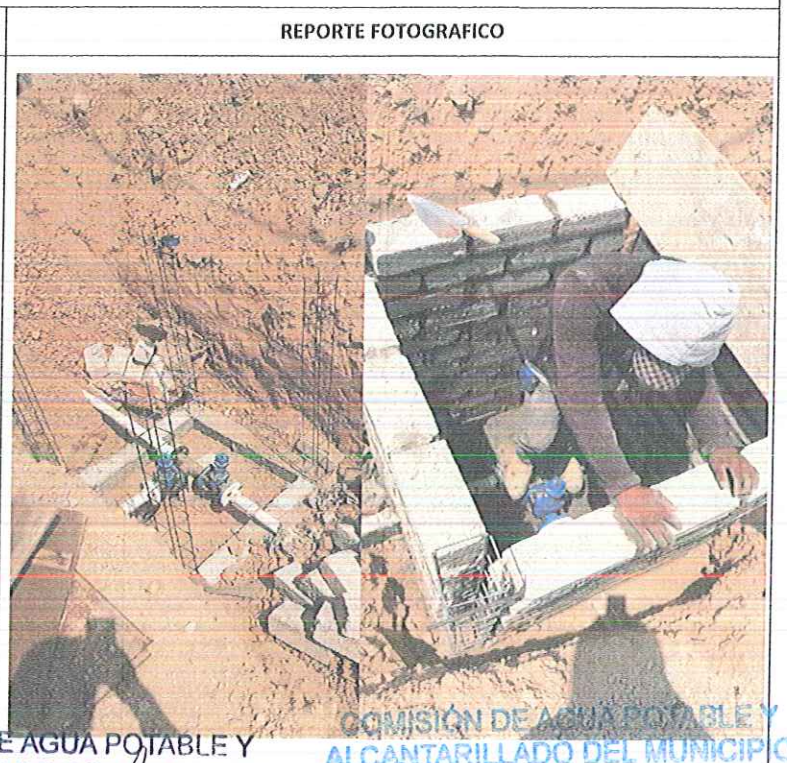
BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 005
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 4		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLACION DE LA OBRA.		FECHA: 29 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION

SUPERVISION POR PARTIDAS:
EN ESTA VISITA DE SUPERVISION SE VERIFICO LA CORRECTA EJECUCION DE LAS CJAS DE OPERACION TIPO 1 DE 1.20*1.20*1.00 M RESPECTIVAMENTE EN LOS 3 SENTIDOS. ESTA EJECUCION SE VERIFICO CON FORME AL PROYECTO Y CATALOGO QUE SE REALIZARA CON MUROS DE TABIQUE, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15X15 CM Y VARILLAS DEL NUMERO 4 Y EST DEL NUMERO 2 REPELLADO INETRIOR Y LOSA DE 10 CM DE CONCRETO ARMADO INCLUYENDO MARCO Y TAPA DE PILETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO REJILLA, ASI MISMO SE CONTINUO LA SUPERVISION DE LAS MANZANAS 1,2 Y6 DE LA COLONIA SEGUN PROYECTO.

UBICACION DE LOS OCNCEPTOS:
MANZANAS 1,2Y6 SEGUN PROYECTO.

OBSERVACIONES:
- NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE ALTERACION CONFORME AL PROYECTO SE QUEDA DE CIERTO QUE LA OBRA PUEDE OCNTINUAR OCN SU EJECUCION.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021

ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021


ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. P. BULMARO VILUMBO REYNA
CONTRALOR INTERNO DE IGUALA

CONTRALORÍA INTERNA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

DIRECCIÓN GENERAL

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 005
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 5		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLOACION DE LA OBRA.		FECHA: 03 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCION

SUPERVISION POR PARTIDAS:
HOY SE REVISARON LAS CAJAS TERMINADOS CON UN TOTAL DE 3 PIEZAS TERMINADAS, TAMBIEN SE VERIFICO LA EXCAVACION Y LOS AFINES SEGUN PROYECTO EN LAS MANZANAS 1,2 Y 6, TAMBIEN SE VERIFICO LA CAMA DE ARENA Y ACOSTILLADO D ELA TUBERIA QUE SIGA LAS ESPCIFICACIONES SEGUN PRYECTO Y CATALOGO, ASI COMO LA INSERCIÓN DE TUBERIA RD 26 DE 2".

UBICACION DE LOS OCNCEPTOS:
MANZANAS 1,2Y6 SEGUN PROYECTO.

OBSERVACIONES:
- NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE ALTERACION CONFORME AL PROYECTO SE QUEDA DE CIERTO QUE LA OBRA PUEDE OCNTINUAR OCN SU EJECUCION.




COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CAPAMI 2018-2021


 ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS.



 ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA DE CAPAMI


 ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CAPAMI 2018-2021


 LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ.
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI.

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 006
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 6		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLACION DE LA OBRA.		FECHA: 03 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCION

SUPERVISION POR PARTIDAS:
EN ESTA VISITA SE VERIFICO EL CIERRE DEL CONCEPTO DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CINTA METRICA Y MAGUERA DE NIVEL Y SE VERIFICARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION. CAMA Y ACOSTILLADO DE TUBERIA OCN ARENA DE MINA EN LA MANZANA 7 Y EL CIERRE DE LAS MANZANAS 1,2 Y 6


UBICACION DE LOS OCNCEPTOS:
MANZANAS 7 SEGUN PROYECTO.

OBSERVACIONES:
- NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE ALTERACION CONFORME AL PROYECTO SE QUEDA DE CIERTO QUE LA OBRA PUEDE OCNTINUAR OCN SU EJECUCION.




COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021


ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021


ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021


LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021


LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN GENERAL

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 007
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 7		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLOACION DE LA OBRA.		FECHA: 21 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCION

SUPERVISION POR PARTIDAS:
SE INFORMA QUE SE VERIFICO EL TERMINO DE LOS TRABAJOS SEGUN PROYECTO EN LAS MANZANAS 7,8 Y 9, CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO SE VERIFICA QUE LOS TRBAJOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL PROYECTO. AL MISMO TIEMPO SE VERIFICO EL INICIO EN LAS MANZANAS 10 Y 5 CON LOS CONCEPTOS DE CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED. AL IGUAL HOY SE VERIFICARON LAS CAJAS DE OPERACION ARMADAS CON LOS CRUCEROS CORRESPONDIENTES, SE SUPERVISO EL CORRECTO EMPLEO DE LAS PIEZAS COMO EMPAQUE Y TORQUE DE LA TORNILLERIA UTILIZADAS E LAS VALVULAS DE V.F DE 2".

UBICACION DE LOS CONCEPTOS:
MANZANAS 7, 8, 9, 10 Y 5 SEGUN PROYECTO.

OBSERVACIONES:
- NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE ALTERACION CONFORME AL PROYECTO SE QUEDA DE CIERTO QUE LA OBRA PUEDE OCNTINUAR OCN SU EJECUCION.



**COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021**

ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

**COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021**


CAPAMI
C.P. BULMARO MUNDO REYNA
CONTRALORIA INTERNA

**COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA**


**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ,
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI.

DIRECCION GENERAL

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 008
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 8		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLACION DE LA OBRA.		FECHA: 26 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCION	REPORTE FOTOGRAFICO
<p>SUPERVISION POR PARTIDAS: ESTE DIA SE PROCEDIO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA EJECUTADA SEGUN CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI MISMO SE REVIJO LA CALIDAD DEL CONCRETO PARA REPOSICION DEL MISMO CON FICHA DE CONCRETO PREMEZCALDO. SE DESCRIBEN LOS VOLUMENES LEVANTADOS:</p> <p>TRAZO Y NEVLACION: 1770 ML EXCAVACION: 1416 M3 CAMA DE ARENA: 177 M3 CORTE Y DEM. DE PAVIMENTO: 200.80 M2 REPOSICION DE CONCRETO: 200.80 M2 INSERCIÓN DE TUBERIA DE 2": 1770 ML VALVULAS DE OPERACION: 12 PZA CAJAS DE OPERACION: 6 PZAS.</p> <p>UBICACION DE LOS CONCEPTOS: TODA LA COLONIA</p> <p>OBSERVACIONES: - NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE ALTERACION CONFORME AL PROYECTO SE QUEDA DE CIERTO QUE LA OBRA PUEDE OCNTINUAR OCN SU EJECUCION.</p>	
<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p> ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.</p>	<p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021</p> <p> VoBo.: LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI.</p>
<p>  </p> <p>CONTRALORÍA INTERNA</p>	

BITACORA DE SUPERVISION	CONTRATISTA: ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO.	UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. RENACIMIENTO.	FOLIO: 009
	SUPERVISOR: ARQ. OSCAR Y. VALLE MARTINEZ	CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CAPAMI	INICIO DE OBRA: 15 MARZO DE 2021
	BITACORA 9		TERMINO DE OBRA: 29 DE ABRIL DE 2021
No. DE CONTRATO CAPAMI-OP-01-2021	HOJA DE DATOS Y PROTOLOACION DE LA OBRA.		FECHA: 29 DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCION

SIENDO EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA EL ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ Y EL ARQ PRIMO FIGUEROA MALDONADO PARA DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE EJECUCION Y DE SUPERVISION DE LA OBRA, HACIENDO LAS PRUEBAS HIDRAULICAS PERTINENTES PARA LA VERIFICACION DE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED.

AL TERMINO DE LAS PRUEBAS NO SE OBSERVO NINGUN TIPO DE PROBLEMA EN LA RED GENERAL DE AGUA, POR LO QUE LA SUPERVISION SE LEVANTAN SIN NIGUN CONTRATIEMPO TERMINANDO LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.



 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021 ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.	 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021 EP. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.	 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021 LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI.
---	---	---





CONTRALORIA INTERNA



DIRECCION GENERAL
